


Situationskarta, Västmanlands sjukhus Fagersta

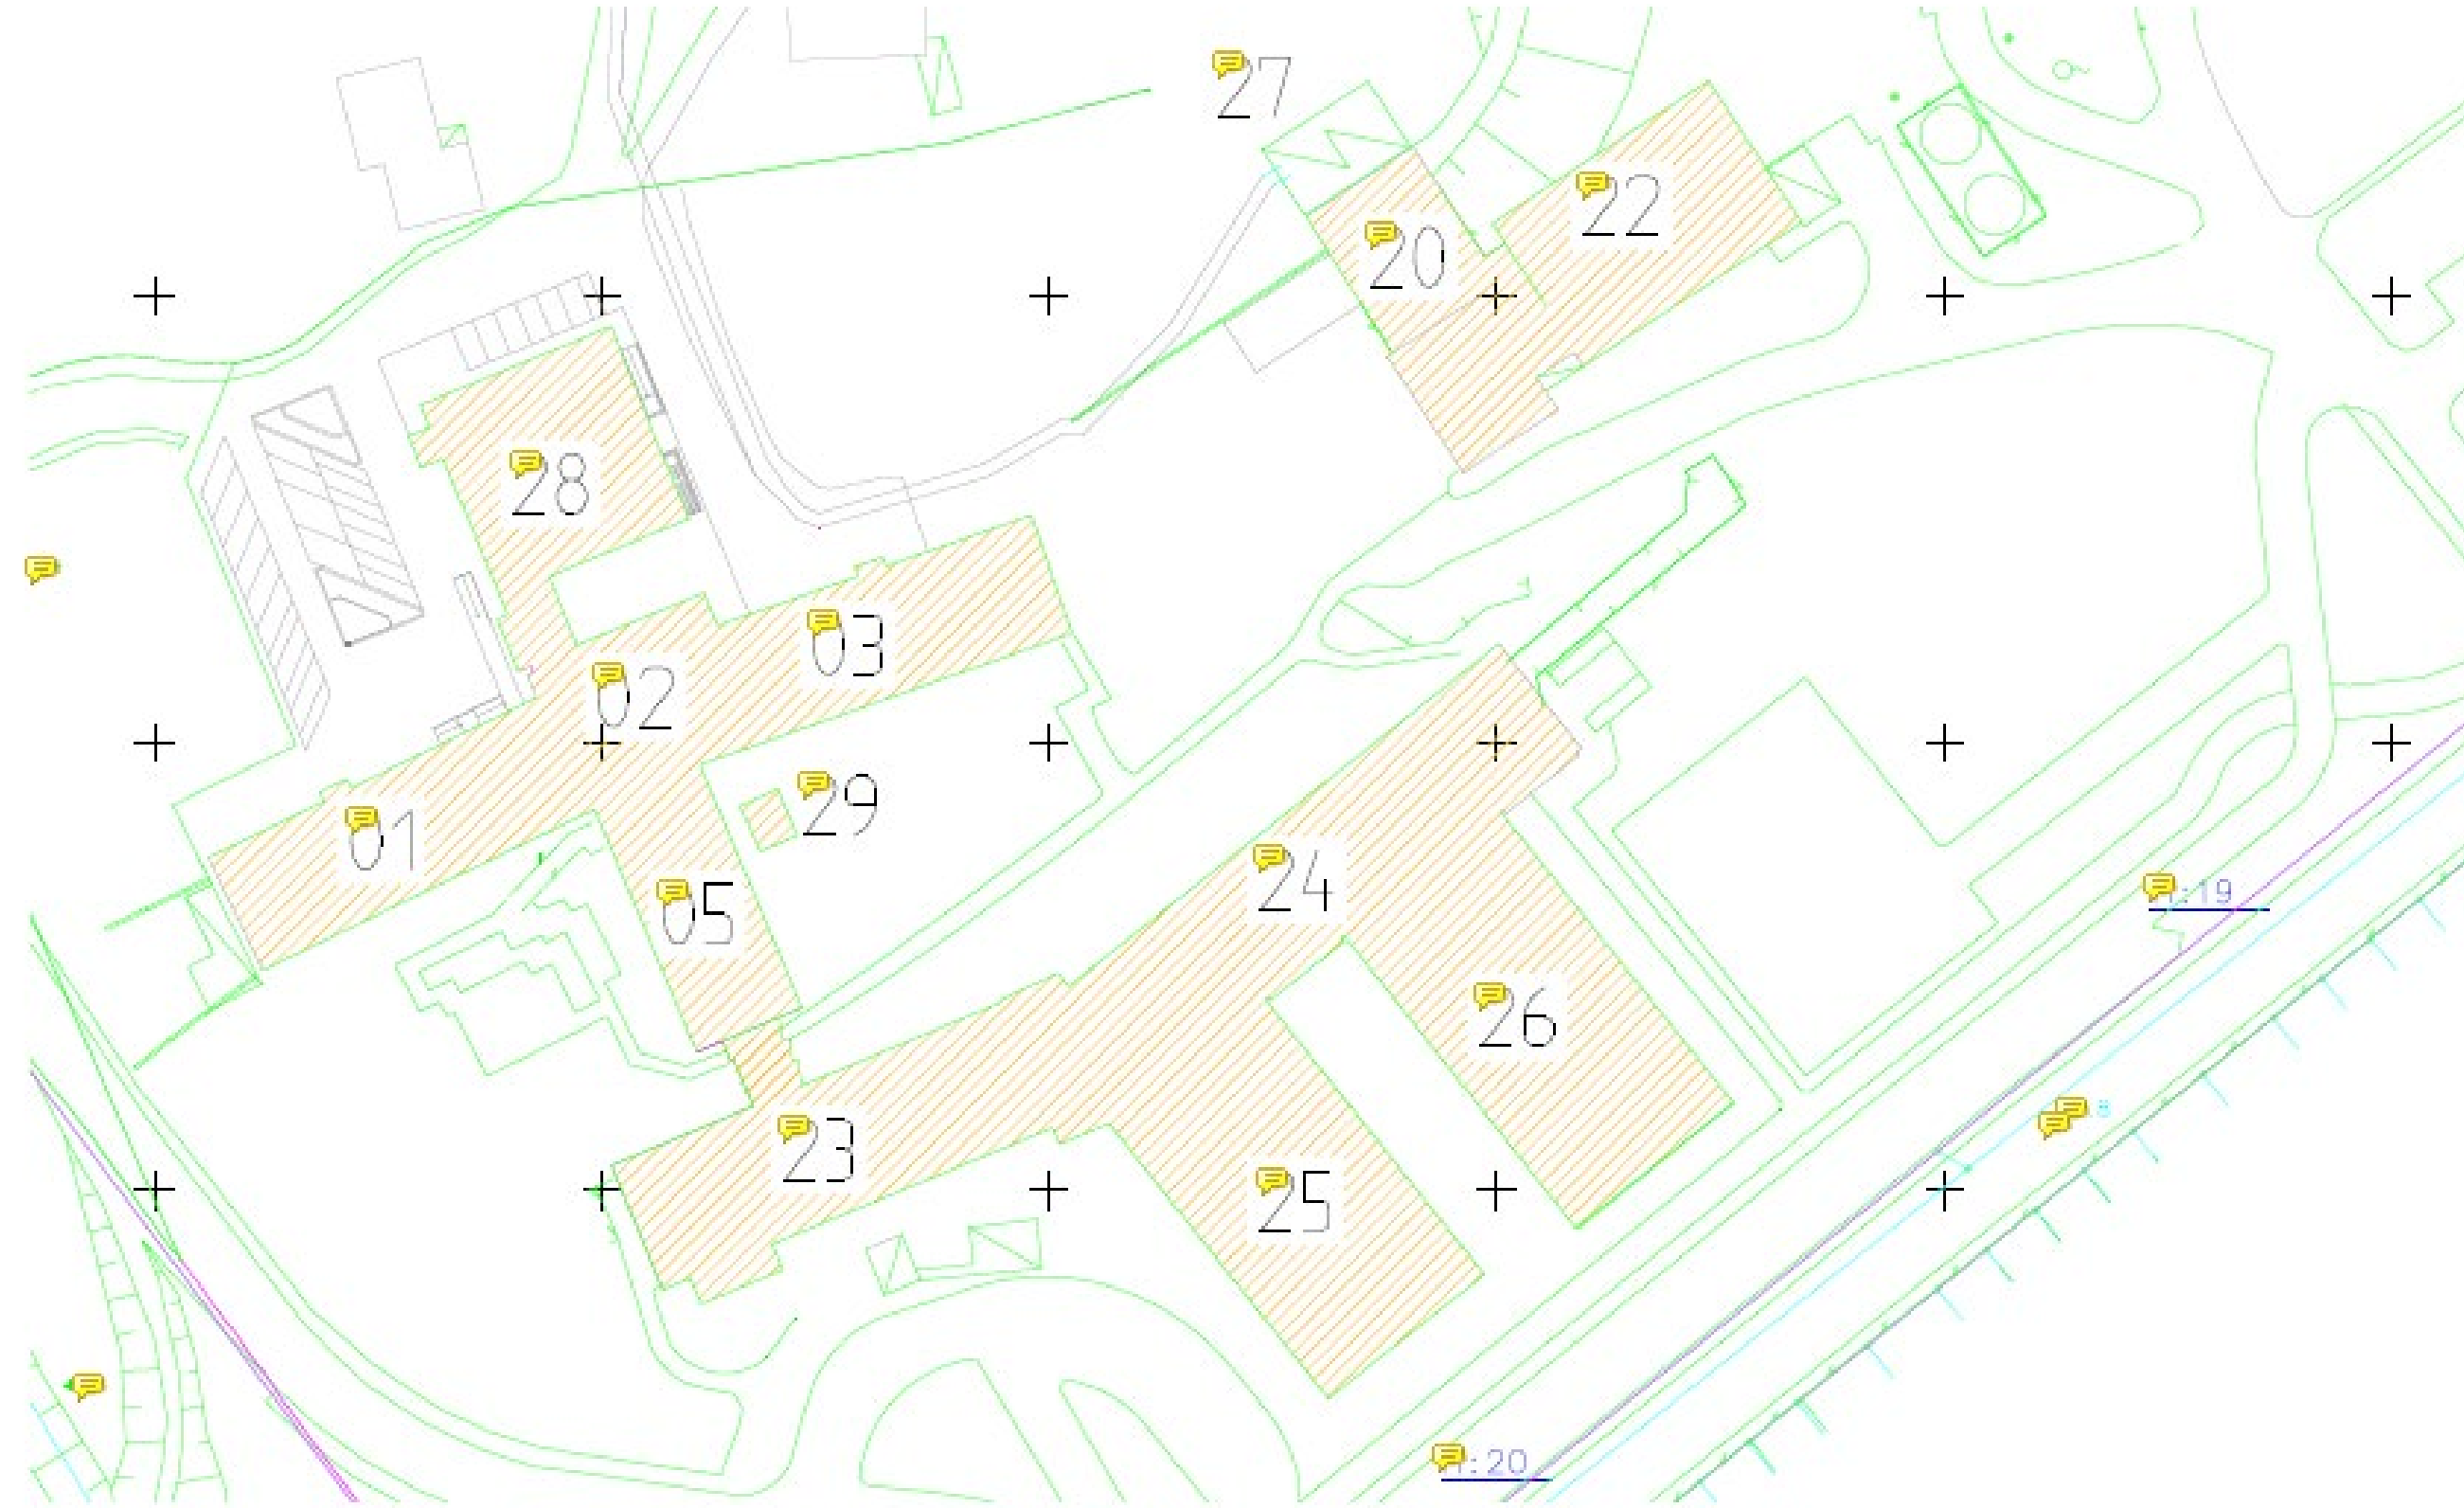

Tidplan

RS beslut, finansiellt igångsättningstillstånd	Budgetram 10 mkr.	14 December
Anbudsförfrågan	Offentlig upphandling, indexreglering tillåts.	V 46 2022- V 3 2023
Kalkylgranskning	Projektgruppen ser över om inkomna anbud följer kalkyl och tidplan vilket är en förutsättning för att förarbeten ska kunna påbörjas och genomföra investeringen 2023. Fördelning, nyinvestering, reinvestering och driftkostnader, Regionfastigheter tar här beslut om investeringen är möjlig att utföra utifrån beslutad finansiering.	- V 3 2023
Förberedande arbeten	Provtryckningar, flödesmätningar, utsugning isolering, demontering av befintlig ventilation samt installation provisorisk ventilation,	Februari – juni 2023
Generalentreprenad	Takarbeten (stomlyft och nytt tak) utförs och installation av ny ventilation.	Juni 2023 – januari 2024.

[illegible]
